


質 疑 回 答 書



No.1

案件名	令和8年度 むくのきセンター既存空調設備等 更新工事及び照明器具LED化工事	質問 年月日	令和8年8月18日	回答 年月日	令和8年8月25日	回答者	事業部 営繕室
-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

番号	図番	質 問	回 答	備 考
1	M-05	図面の撤去リストに記載されている記号が内訳書50ページ 目の搬出費の記号に反映されていないので、内訳書と照合 出来るようにお願いいたします。	搬出機器と対応する新設機器の記号を記載しておりました。対応する記号は 以下のとおりです。 ・ACP-1→PAC1-T ・ACP-2→PAC2-T ・ACP-3→PAC3-T ・EHP-1→AC-4T ・EHP-2→AC-7C ・EHP-3→AC-6C ・EHP-4→AC-5C ・EHP-5→AC-8C ・EHPIC-1→IAC-1C ・EHPIC-2→IAC-2K ・EHPIC-3→IAC-3K ・EHPIC-4→IAC-4T ・EHPOA-1→OAC-1K ・EHPOA-2→OAC-2T ・EHPOA-3→OAC-3C ・EHPOA-4→OAC-4K ・EHPOA-5→OAC-5K ・EHPOA-5→OAC-5K ・EHPOA-6→OAC-6K ・EHPOA-7→OAC-7T ・HEU11→HEU-11T	
2		空調設備と換気設備の撤去図面がありませんが、追加資料 として頂くことは可能でしょうか？	既設機器撤去部分に新設機器を設置する設計となっていま す。撤去図面の追加はいたしません。竣工時の図面を参 考としてください。	
3				
4				
5				

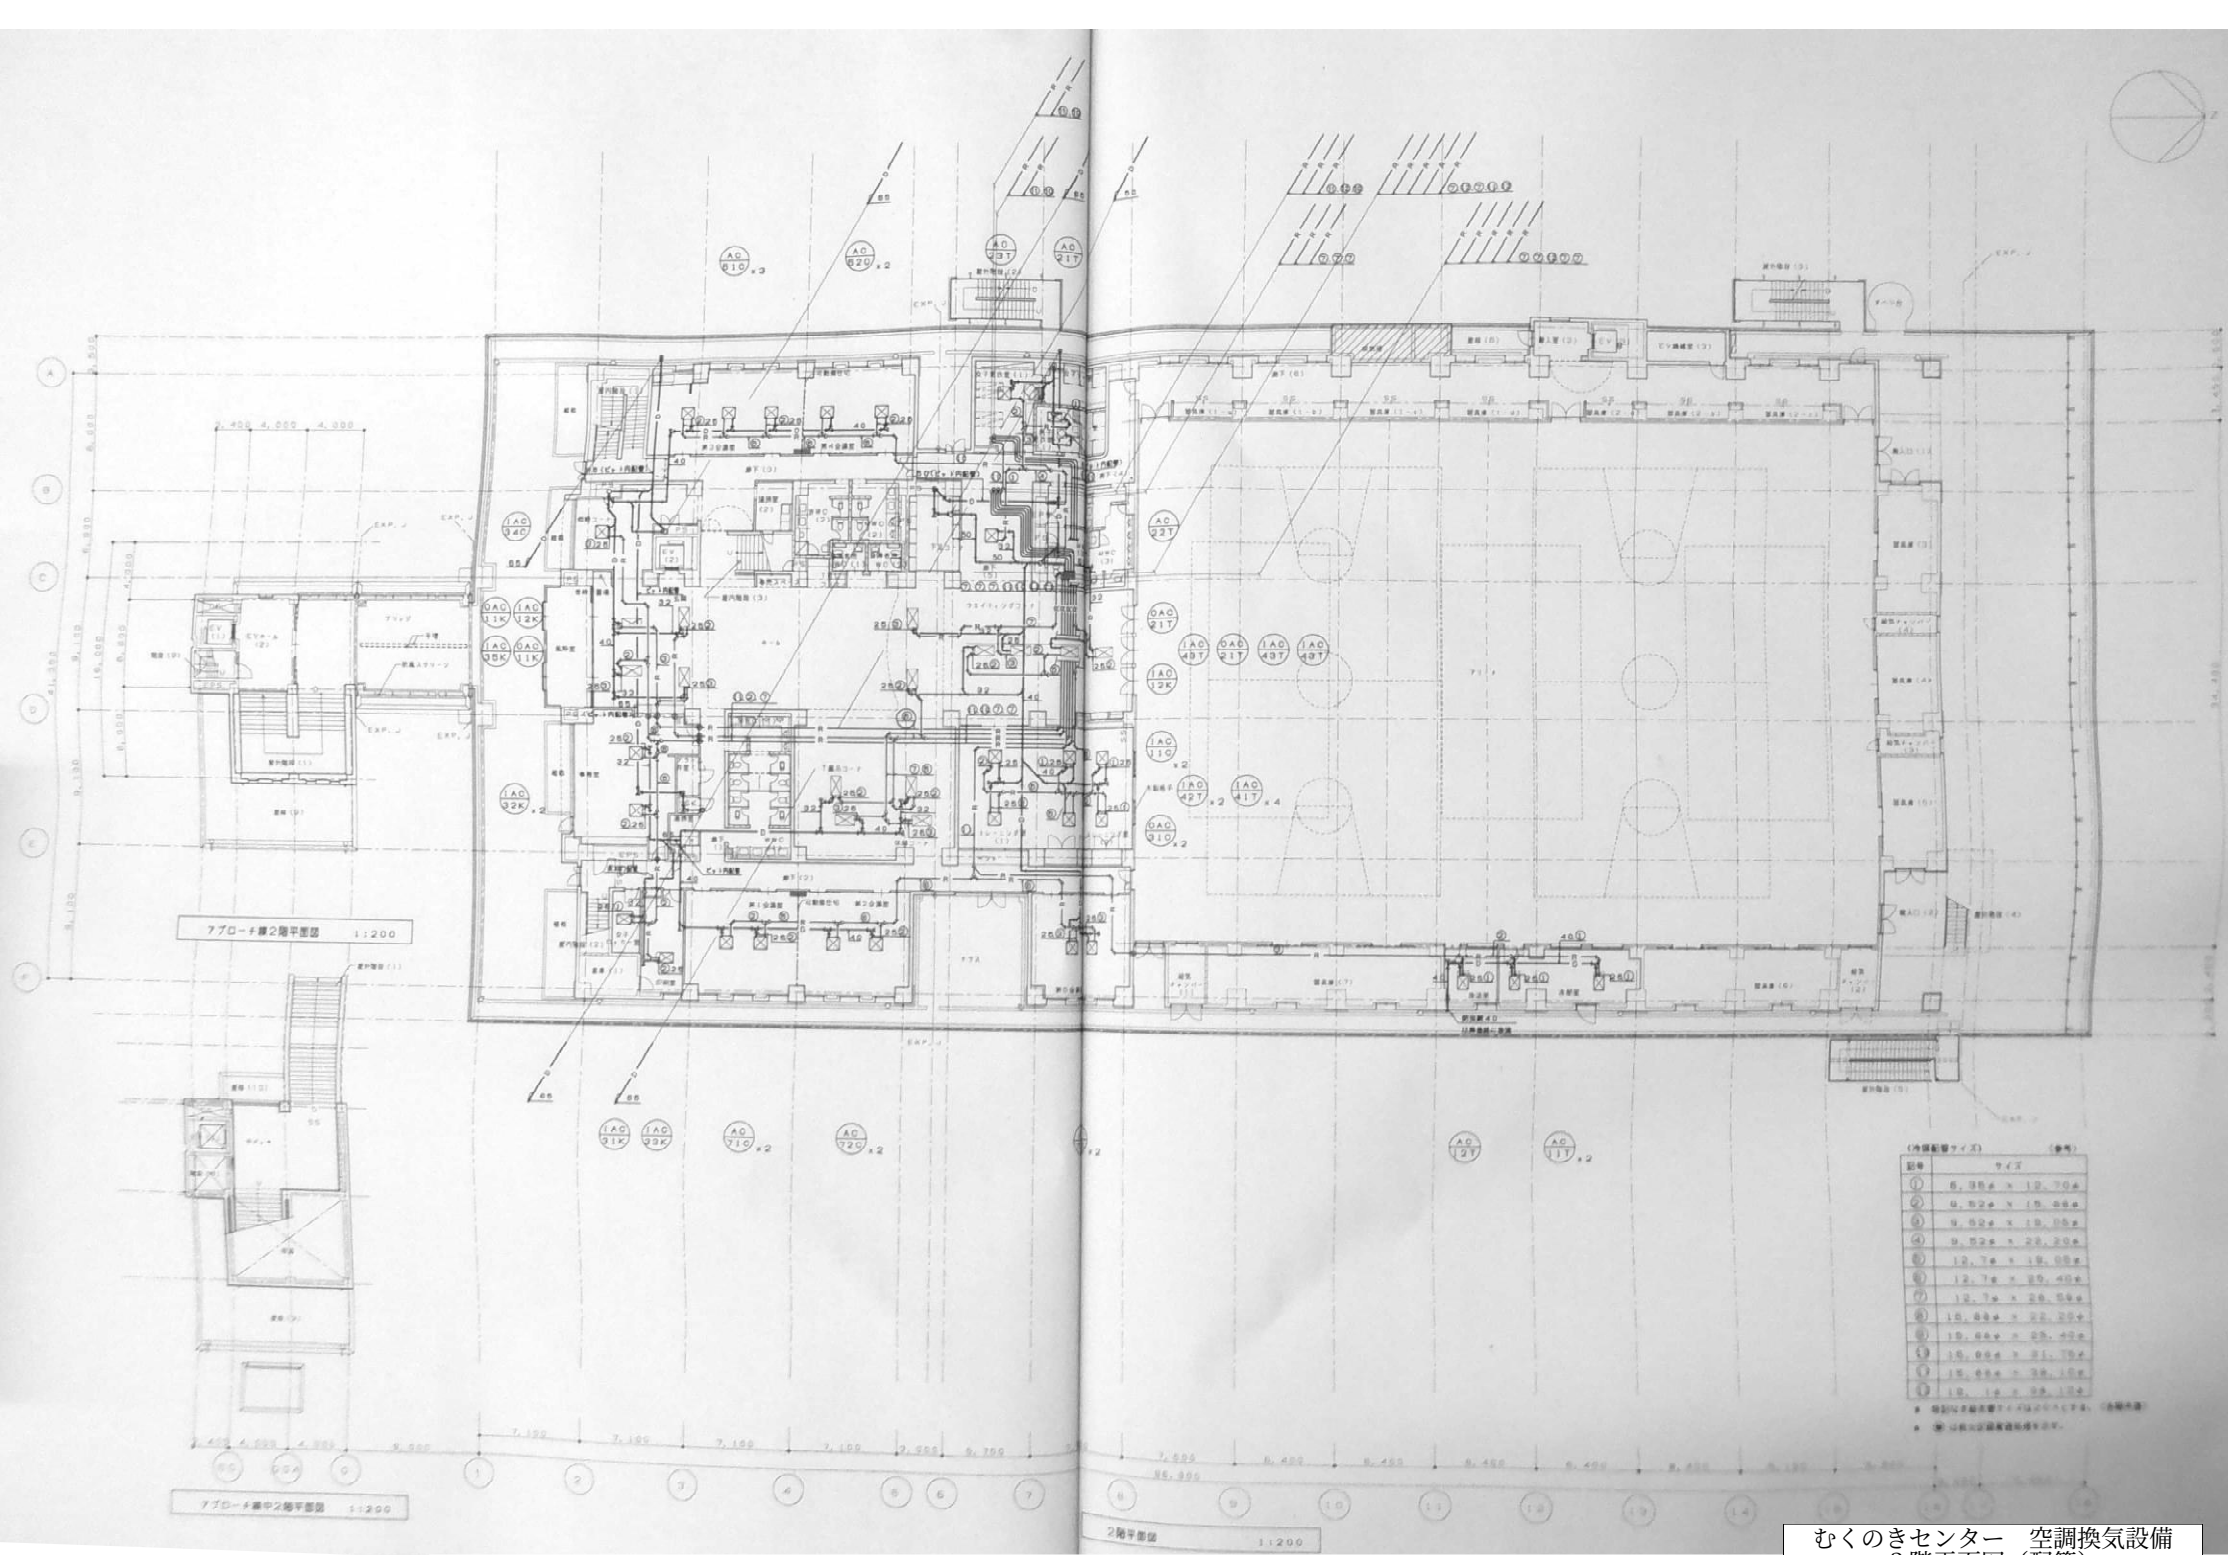

むくのきセンター 空調換気設備
2階平面図 (配管)

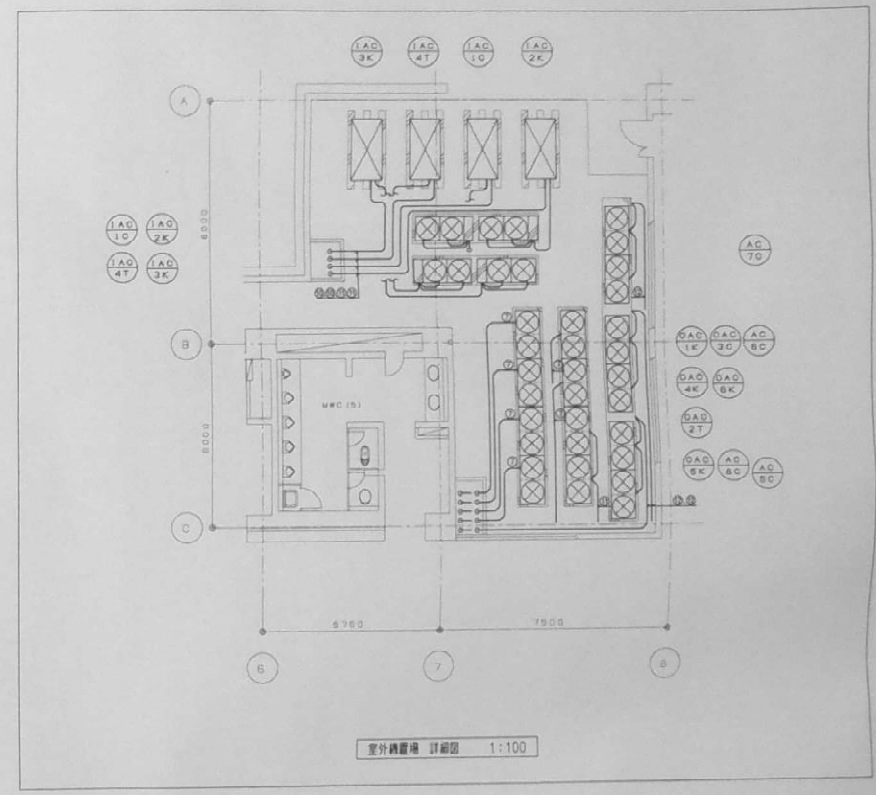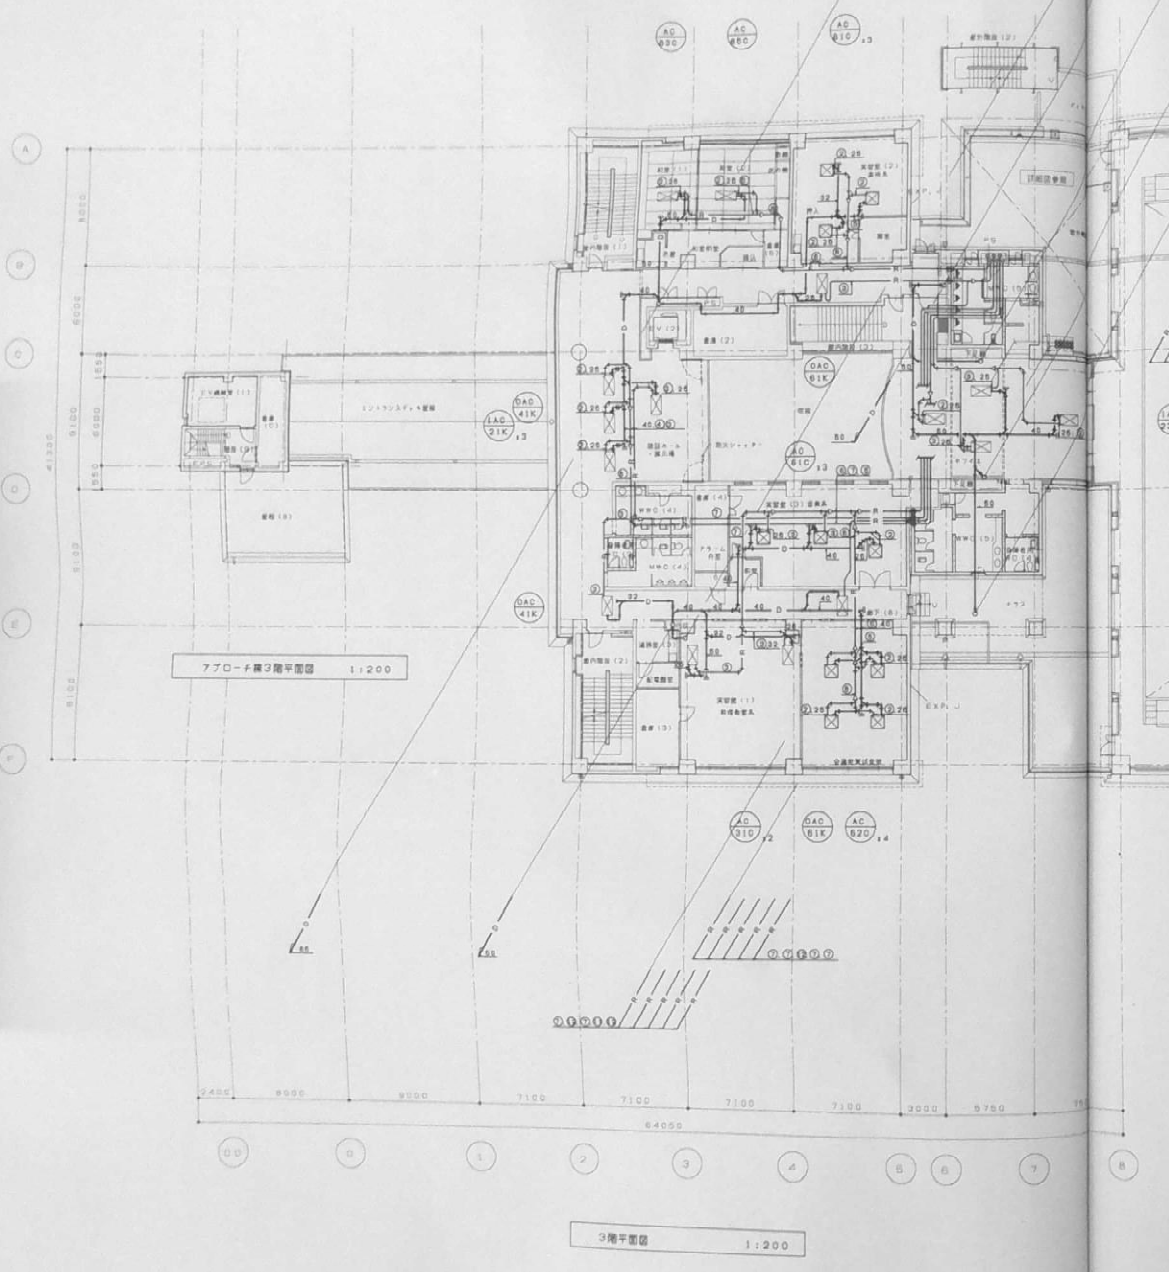

記号	サイズ
①	6.35φ x 12.70φ
②	8.52φ x 15.88φ
③	8.52φ x 19.05φ
④	8.52φ x 22.20φ
⑤	12.7φ x 19.05φ
⑥	12.7φ x 25.40φ
⑦	12.7φ x 28.58φ
⑧	15.88φ x 22.20φ
⑨	15.88φ x 25.40φ
⑩	15.88φ x 31.75φ
⑪	15.88φ x 38.10φ
⑫	19.14φ x 38.10φ

※ 特記なき給排水管サイズは20Aとする。(流路内)
● は熱交換器の位置を示す。

2階平面詳細図 (ダクト)

質 疑 回 答 書

No.1

案件名	令和8年度 むくのきセンター既存空調設備等 更新工事及び照明器具LED化工事	質問 年月日	令和8年8月24日	回答 年月日	令和8年8月25日	回答者	事業部 営繕室
-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

番号	図番	質 問	回 答	備 考
1	M-03, 04, 10, 11	図面の注)リモコンは現状と同じ場所に設置と記載がありますが、平面図にワイヤードリモコンがかかれていません。系統毎(1部屋)にワイヤードリモコン1個と考えれば宜しいでしょうか？図面があればお願いします。	ワイヤードリモコンについては、新設の機器リストの付属品の欄に記載しており、機器毎に計上しております。	
2				
3				
4				
5				
